

ZÁRÓ MŰSZAKI - SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A projekt megvalósítását követően, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor fotókkal ellátott, legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámolót - az indikátor(ok) teljesülésére vonatkozó kiegészítéssel - szükséges megküldeni a HACs részére elektronikusan a 2. Ügyfélszolgálatok elérhetőség pontban szereplő email címre, a HACs honlapján történő megjelenés céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését.

Alulírott Mayer Róbert egyéni vállalkozó (székhely: 7771 Palkonya, Fő utca 91., adószám: 64401186-2-22, ügyfél-azonosító: 1000280820) ezúton mutatom be a Vidékfejlesztési Program „Helyi fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-19-4.1-23 kódszámú helyi felhívásra benyújtott „Szálláshely-szolgáltatás fejlesztése Palkonyán” című, 3451654149 projektazonosító számú nyilvántartott támogatási kérelemben megvalósított szakmai tevékenységeket.

Az egyéni vállalkozásom 2023. június 24-én támogatási kérelmet nyújtott be a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete által meghirdetett VP6-19.2.1.-19-4.1-23 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra. A támogatási kérelem elbírálását követően a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága megküldte a 2024. április 30-án kelt Támogatási Okiratot. A projekt teljes nettó költsége 3.580.049 Ft, az elszámolható összes nettó költsége 3.580.049 Ft, a megítélt támogatás 2.148.027 Ft 60%-os támogatási intenzitás mellett.

A Támogatási Okiratban szereplő mérőföldkő módosítása vált szükségessé a projekt megvalósítási időszaka alatt. Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mérőföldkővek) módosítására vonatkozó változás bejelentés 2024.11.18-án került beküldésre az 1. mérőföldkő módosítására. A mérőföldkő dátuma 2025.05.05-re lett módosítva. A mérőföldkőhöz kapcsolódó záró kifizetési igénylés legkésőbb az utolsó mérőföldkő elérését követő 30. napig benyújtásra kerül.

A projekt eredményeképp egy új magánzálláshely létesült Palkonyán.

A projekt megvalósított műszaki tartalma:

- a szálláshely berendezési tárgyainak beszerzése

A projekt fizikai befejezéséig megtörtént az eszközbeszerzés tevékenység 100%-os megvalósítása. A projekt adminisztratív lezárása megtörtént. A projekt sikeres megvalósítását igénybe vett szolgáltatásként folyamatos projektmenedzsment szolgáltatás segítette.

A fejlesztés megvalósításával az alábbi eredményeket értük el:

- az elérhető helyi szolgáltatások körének bővülése, a turisztikai szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének javítása,
- a helyi gazdaság turisztikai és gazdasági teljesítőképességének növekedése és térbeli kiterjedése,
- az egyéni vállalkozás gazdaságban betöltött szerepének és piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének fokozása,
- technológiai háttér fejlesztése,
- további fejlesztések generálása.

Palkonya, 2025. május 5.





Mayer Róbert
egyéni vállalkozó

P.H.

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ




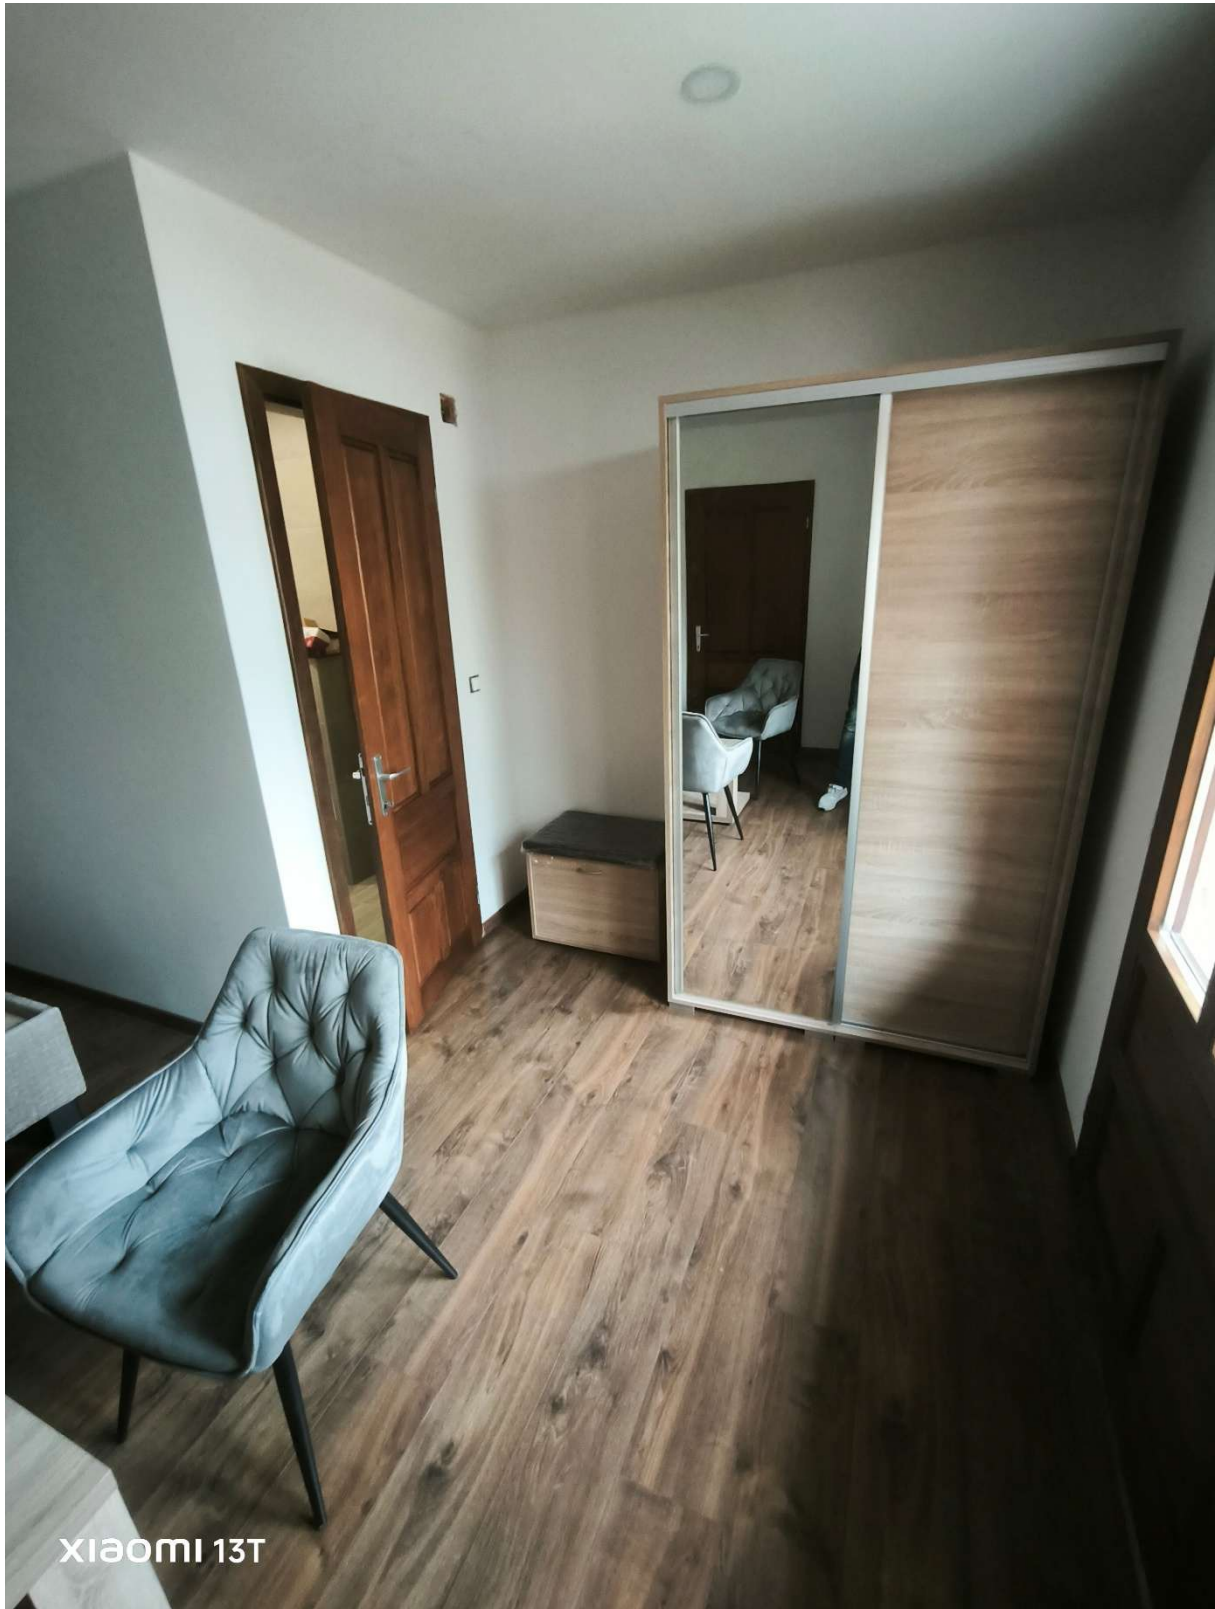


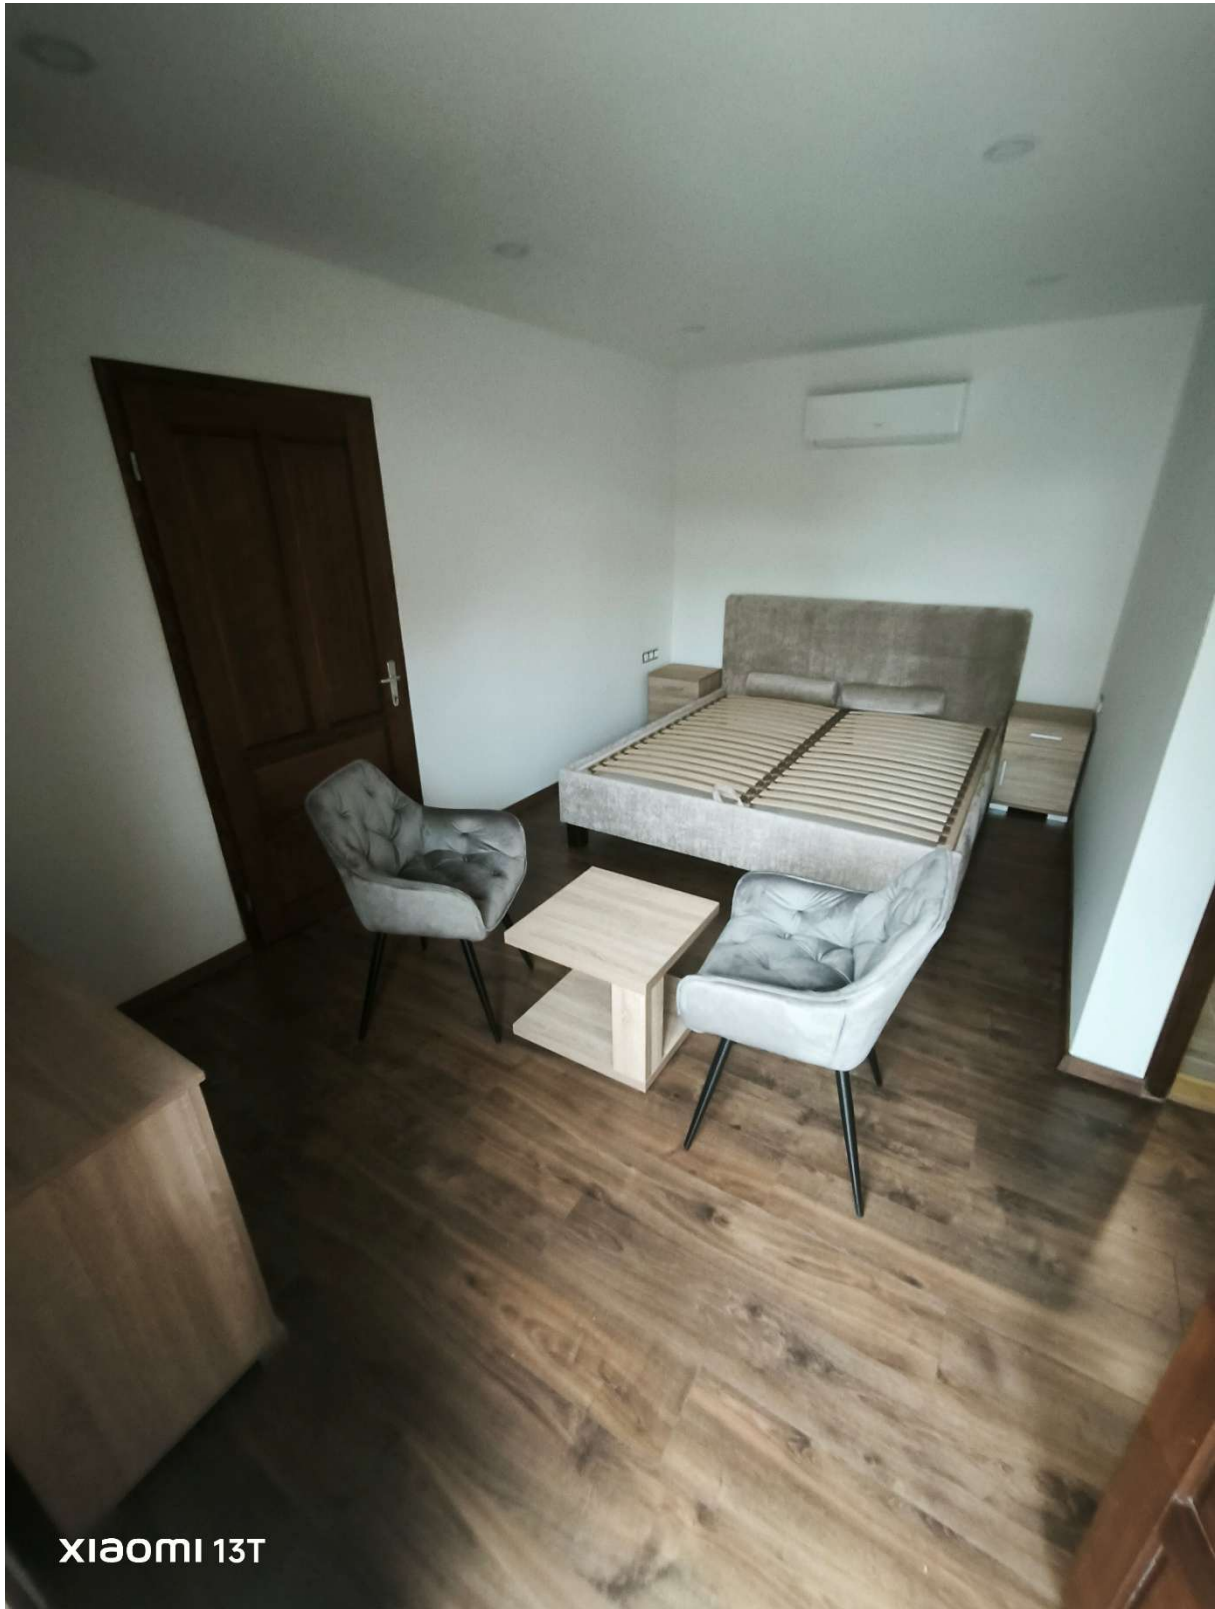

XIOMI 13T



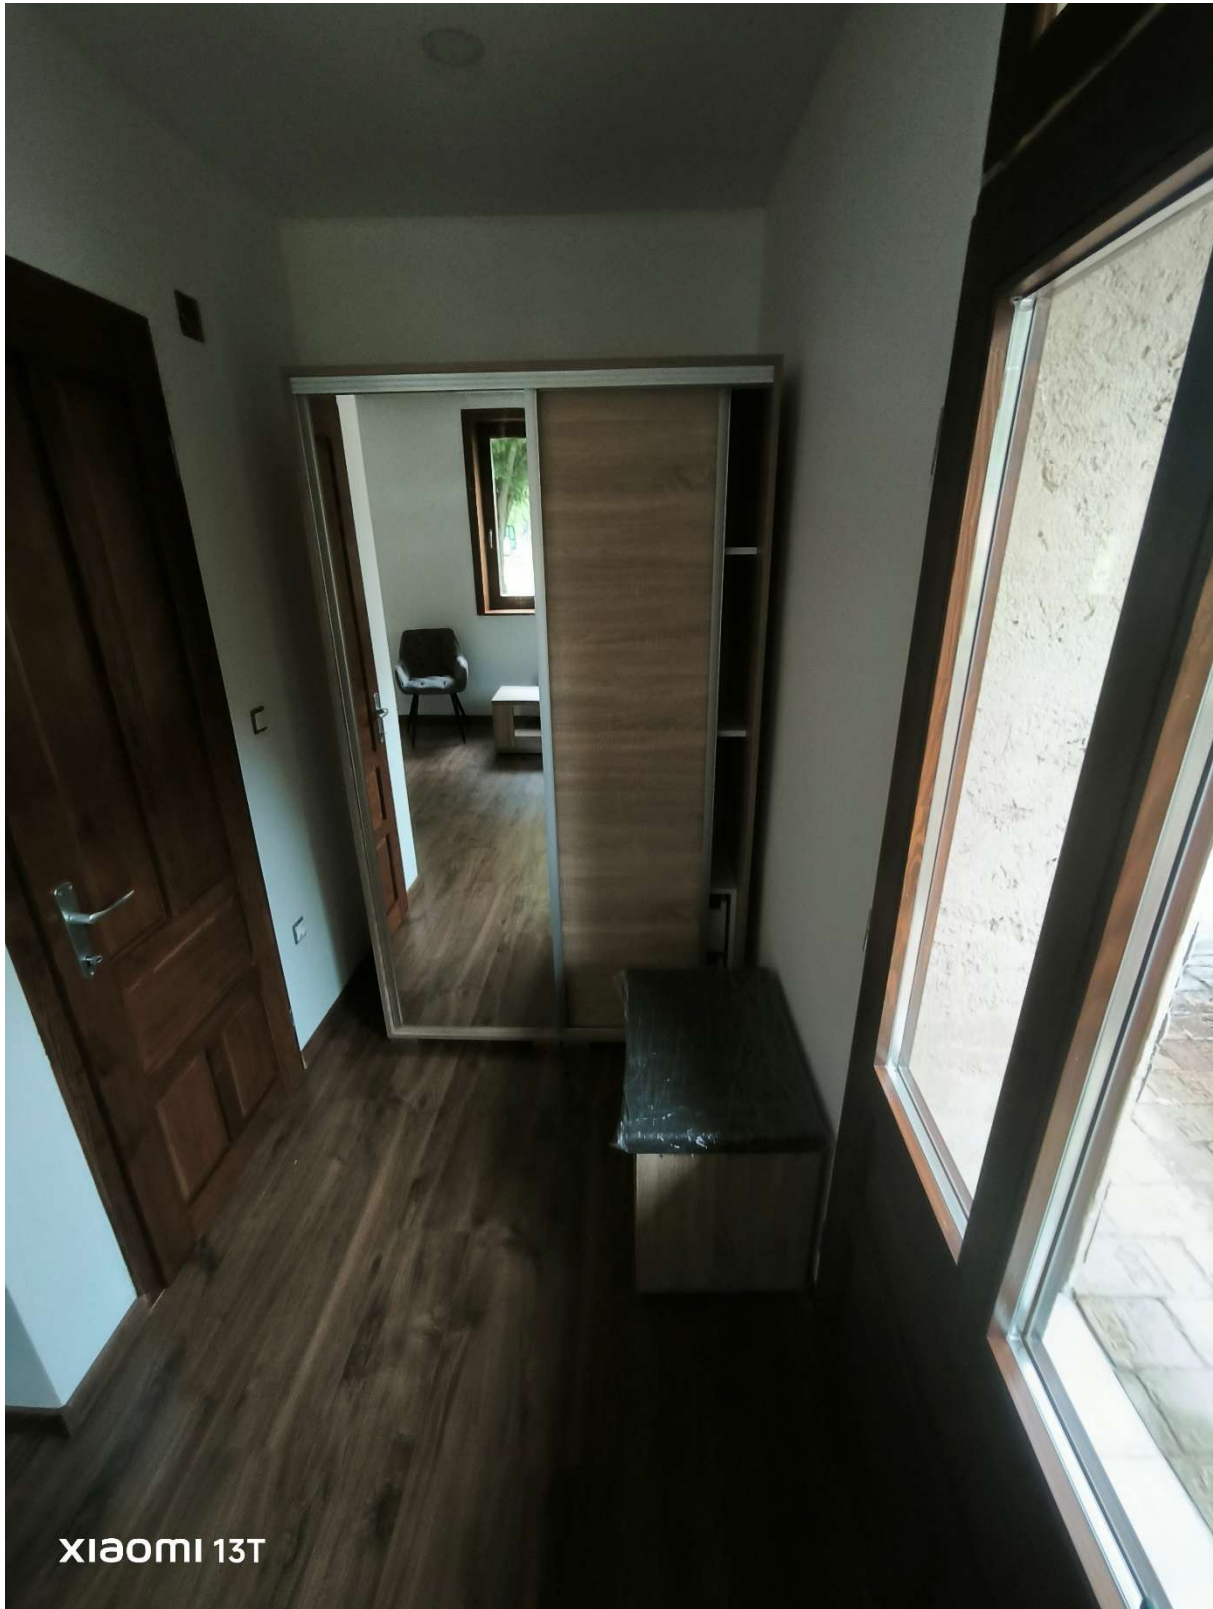

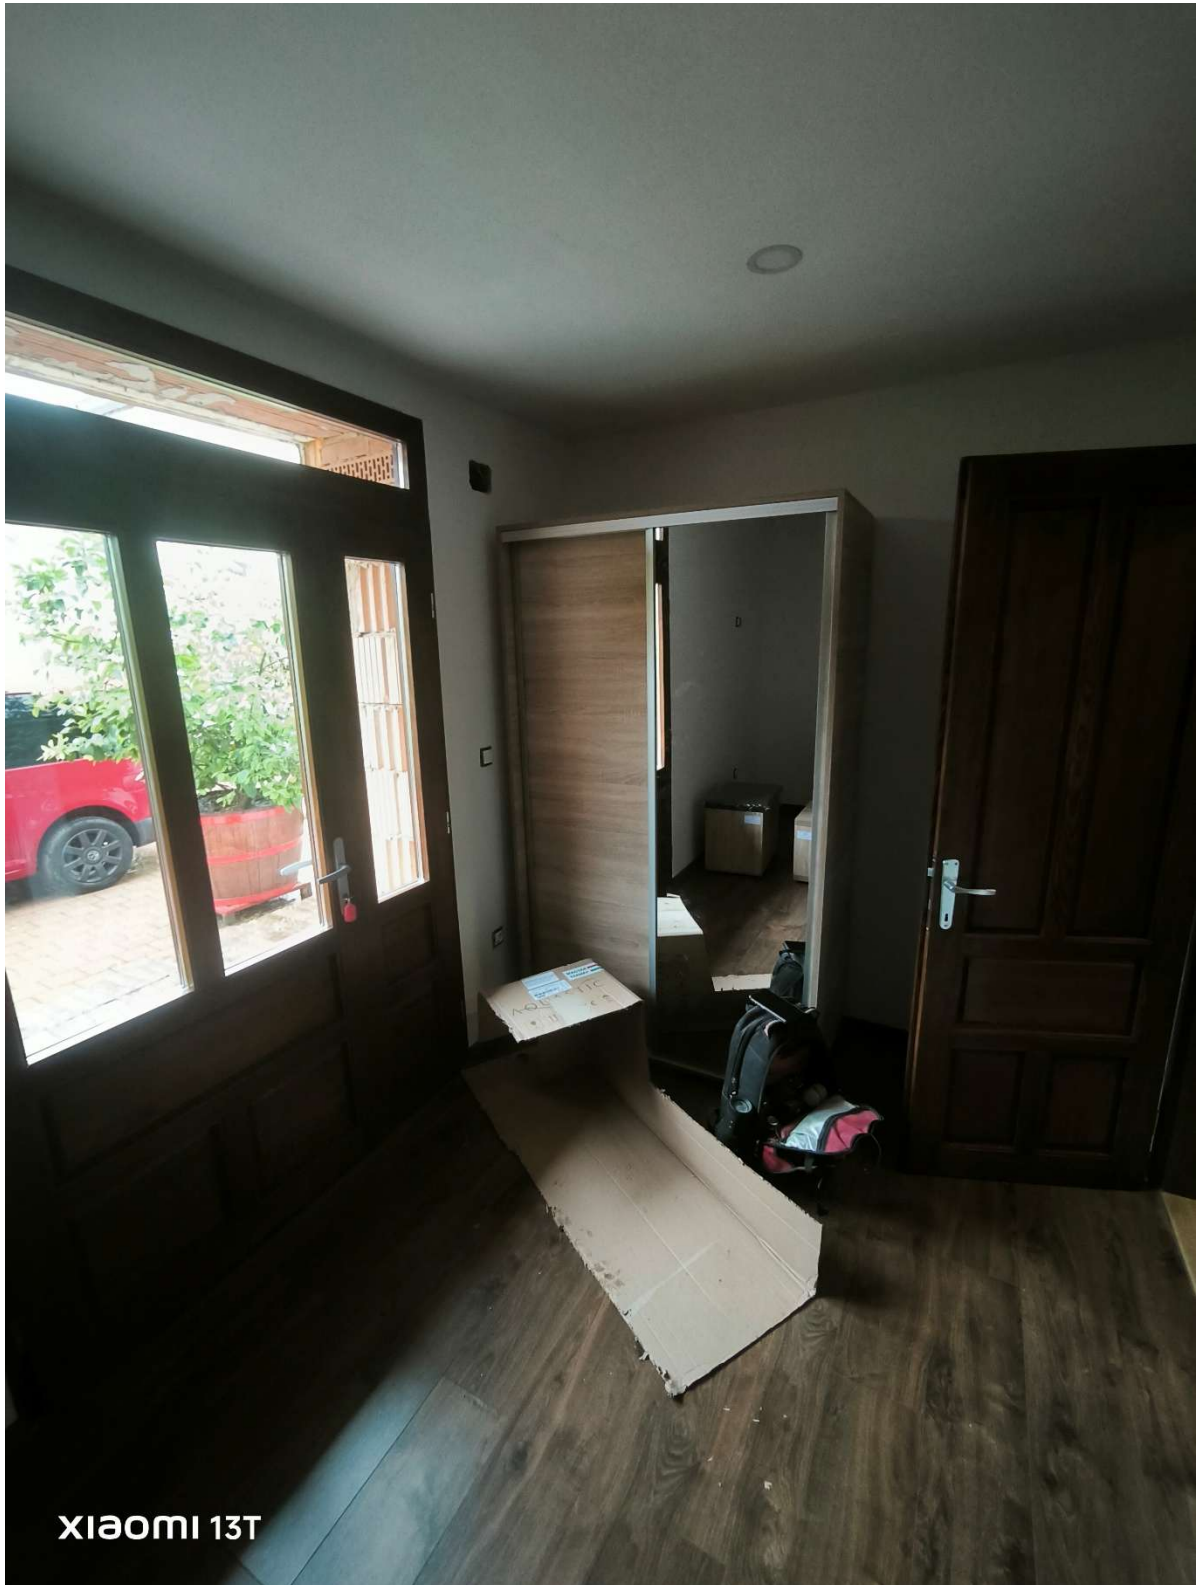

XIAOMI 13T

